


Réalisation de sondages dans le cadre de la réalisation de murs de soutènement

INTERVENTION : CHEMIN DE SAINT-FRANCOIS – 13710 FUVEAU

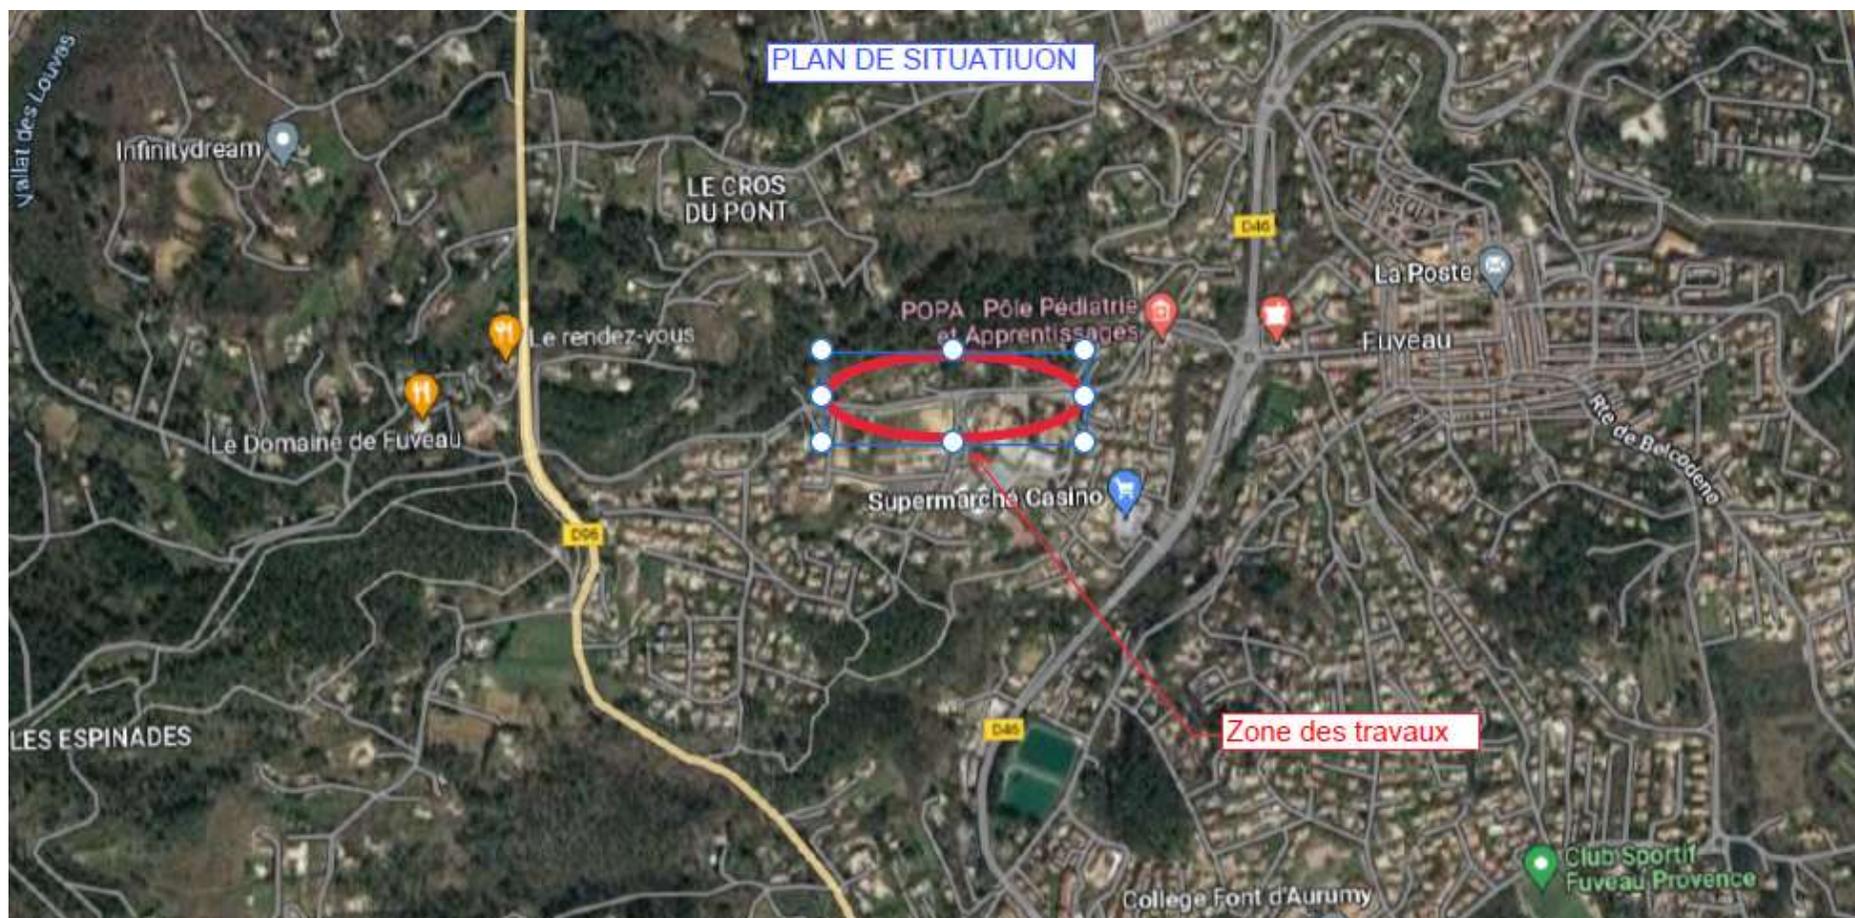

Lieu d'intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU

Date totale prévisionnelle d'intervention : Entre 4 et 10 jours

INTERVENTION N°1 : ZONE 1 (premier et second sondage)



Lieu d'intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU

Date totale prévisionnelle d'intervention : Entre 4 et 10 jours

PROPOSITION D'ORGANISATION POUR LA CIRCULATION ZONE 1 :

SONDAGE 1 ET 2 :



Mise en place d'un feu bicolore pour circulation alternée, sans fermeture totale de la circulation.

Cette intervention pour le premier sondage (impactant la circulation) est prévue pour environ 1 journée (ou 2 jours au maximum).

Ce point de sondage ne sera pas réalisé sur la route. La circulation des véhicules et des piétons ne sera pas impactée.

X : Implantation des sondages

↗ : Déviation

X : Feu bicolore pour circulation alternée et panneau signalisation

IMPLANTATION DES SONDAGES EN ZONE 1 :

SONDAGE 1 :



Positionnement de notre machine de forage lors de la réalisation du premier sondage en zone 1.

Durant la réalisation de ce sondage, une circulation alternée sera mise en place avec des feux bicolores de signalisation.

SONDAGE 2 :



Positionnement de notre machine de forage lors de la réalisation du second sondage en zone 1.

Durant la réalisation de ce sondage, la circulation des véhicules et des piétons ne sera pas impactée.

INTERVENTION N°2 : ZONE 2 (troisième et quatrième sondage)




Lieu d'intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUYEAU

Date totale prévisionnelle d'intervention : Entre 4 et 10 jours

PROPOSITION D'ORGANISATION POUR LA CIRCULATION ZONE 2 :

SONDAGE 3 :

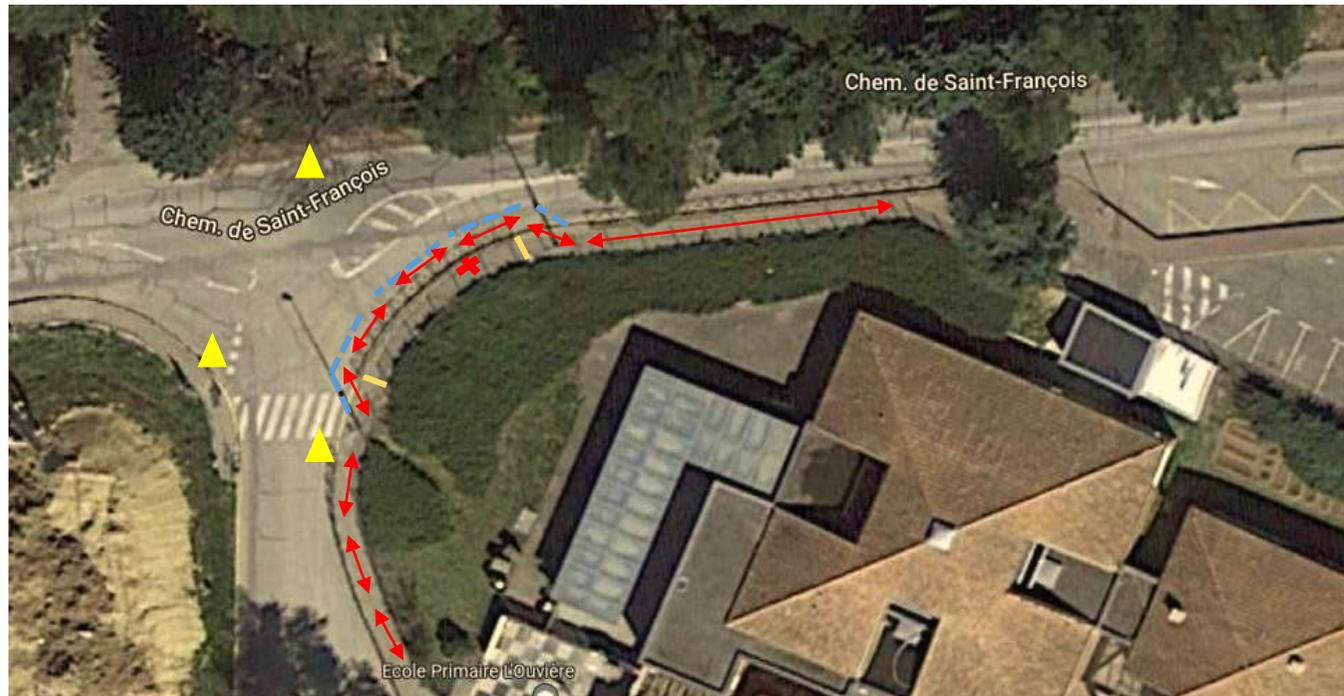

L'intervention du troisième point de sondage se déroulera sur le trottoir.

Afin de garantir la sécurité des piétons, une déviation sera mise en place (avec signalisation, barrière de chantier...) au niveau de la route, seulement sur la partie du sondage.

Cette intervention sur cette zone est prévue pour environ 1 journée (ou 2 jours au maximum).

∕ : Route barrée (piétons)

▲ : Signalisation pour véhicules

✗ : Implantation du sondage


↔ : Déviation piétons

∕∕ : Barrière de chantier pour déviation piétons (+ signalisation)

Lieu d'intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU

Date totale prévisionnelle d'intervention : Entre 4 et 10 jours

SONDAGE 4 :

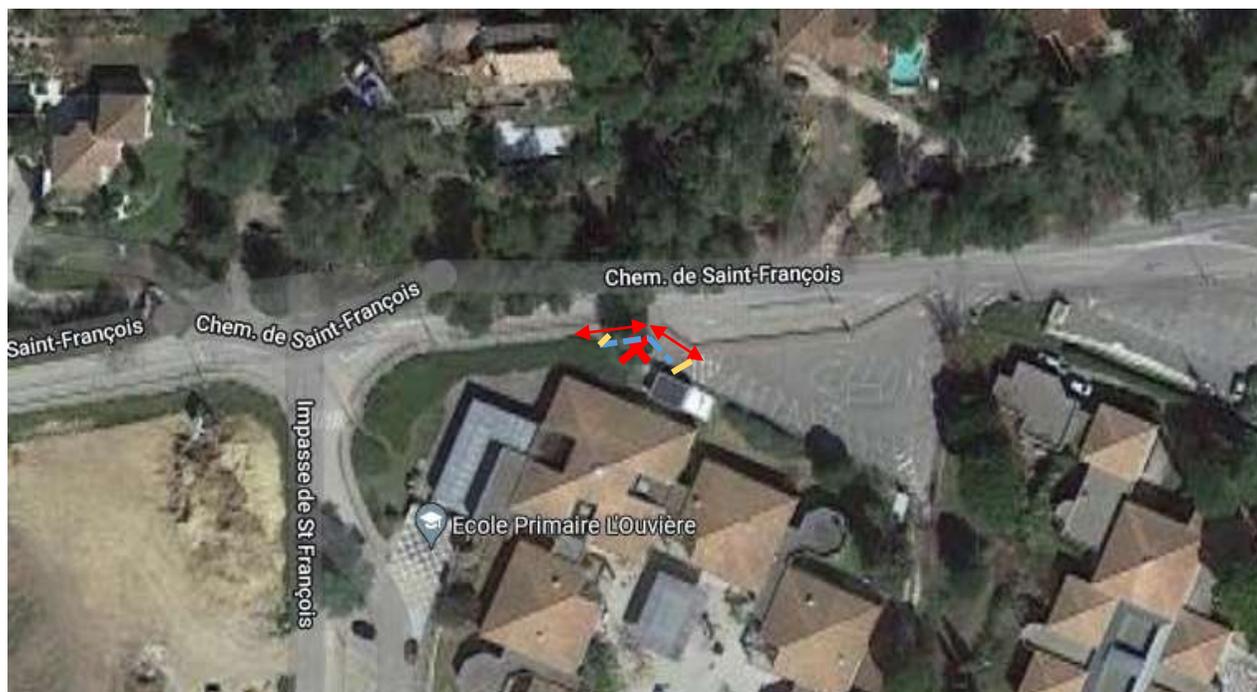

L'intervention sur le quatrième sondage se déroulera sur le trottoir.

Afin de garantir la sécurité des piétons, une déviation sera mise en place (avec signalisation, barrière de chantier...) sur le même trottoir, seulement sur la partie du sondage.

Durant la réalisation de ce sondage, une légère déviation pour la circulation des piétons sera mise en place.

Cette intervention sur ce sondage est prévue pour environ 1 journée (ou 2 jours au maximum).

— : Route barrée (piétons)


✘ : Implantation du sondage

↔ : Déviation piétons

— : Barrière de chantier pour déviation piétons (+ signalisation)

IMPLANTATION DES SONDAGES EN ZONE 2 :

SONDAGE 3 :

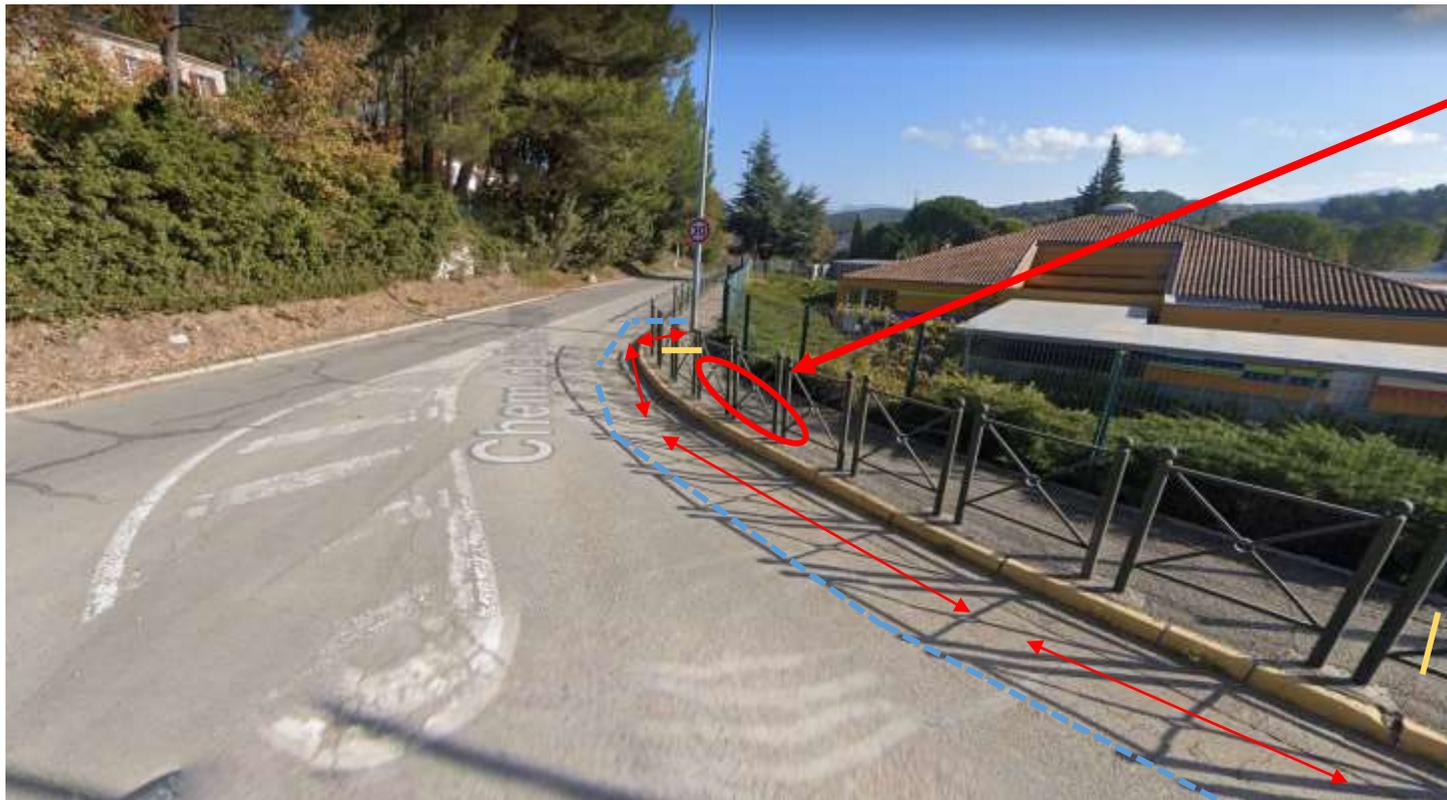

Positionnement de notre machine de forage lors de la réalisation du troisième sondage en zone 2.

Durant la réalisation de ce sondage, une déviation piétons sera mise en place avec toutes les dispositions nécessaires pour garantir leur sécurité (barrière de chantier, signalisation...).

Une signalisation sera également mise en place pour les véhicules, pour avertir du danger.

— : Route barrée (piétons)

✗ : Implantation du sondage ↗ : Déviation piétons - - - : Barrière de chantier pour déviation piétons (+ signalisation)

Lieu d'intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU

Date totale prévisionnelle d'intervention : Entre 4 et 10 jours

SONDAGE 4 :



Positionnement de notre machine de forage lors de la réalisation du quatrième sondage en zone 2.

Durant la réalisation de ce sondage, une légère déviation pour la circulation des piétons sera mise en place, sans impact direct sur la route.

↘ : Route barrée (piétons)

✘ : Implantation du sondage ↗ : Déviation piétons - - - : Barrière de chantier pour déviation piétons (+ signalisation)

Lieu d'intervention : Chemin de Saint-François – 13710 FUVEAU

Date totale prévisionnelle d'intervention : Entre 4 et 10 jours
